RENCANA KEGIATAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2009 - 2010

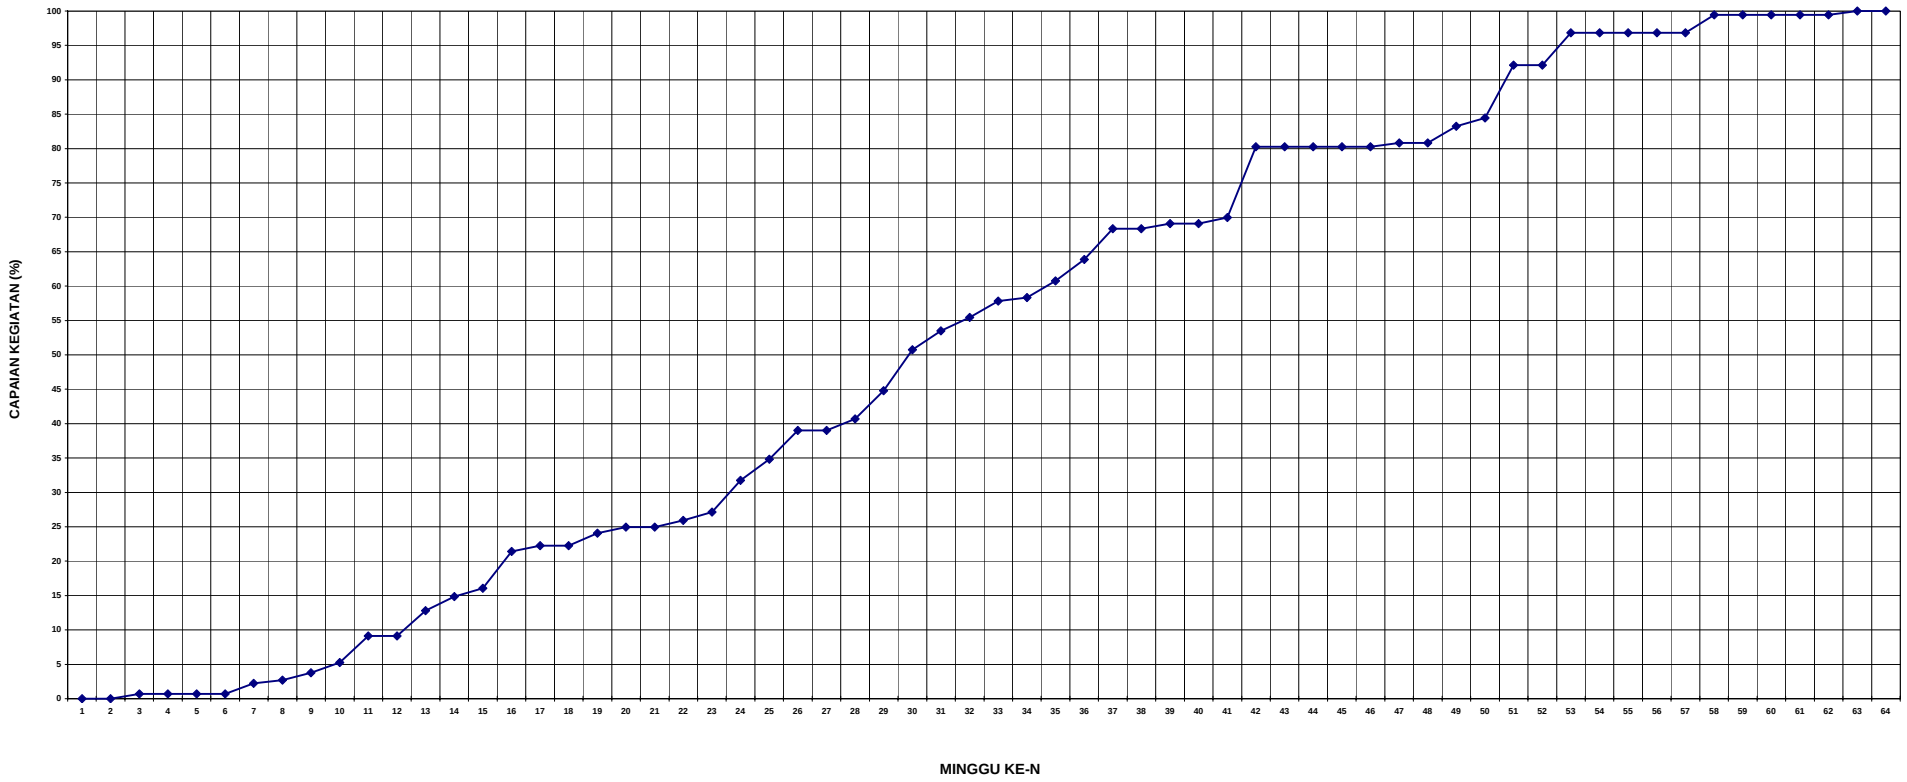

MILESTONE PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2009 - 2010

NO		JENIS KEGIATAN	RENCANA MASTER SCHEDULE		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				TAHUN 2010								MARET				APRIL				MEI				JUNI			
			Mulai	Selesai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
II		BULAN MARET 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																		
	1	Pelatihan Dasar -1	2-Mar-09	20-Mar-09			0.70																																																													
III		BULAN APRIL 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																		
	1	Mobilisasi Faskel	1-Apr-09	16-Apr-09							0.58																																																									
	2	Lokakarya Review Program Provinsi (1x)	16-Apr-09	14-May-09														1.08																																																		
	3	Pelatihan Madya -1 Fasilitator dan Askot (13hari) (Review2, Kemitraan, Musrembang, CDI, Nirlaba, KSM)	18-Apr-09	30-Apr-09								0.47																																																								
B		PEMDA KOTA/KAB LAMA																																																																			
	1	Sosial mapping tingkat Kota/Kab	4-Apr-09	16-Apr-09							0.47																																																									
	2	Sosialisasi Intensif melalui FGD dengan Stakeholder Kota/Kabupaten	23-Apr-09	15-May-09											0.85																																																					
C		PEMDA KOTA/KAB BARU																																																																			
	1	Sosial mapping tingkat Kota/Kab	4-Apr-09	16-Apr-09							0.47																																																									
	2	Lokakarya Orientasi Kota/Kab Baru (1x)	22-Apr-09	6-Jun-09													1.72																																																			
	3	Lokakarya Orientasi Kecamatan Kota/Kab Baru (1x)	23-Apr-09	7-Jun-09													1.72																																																			
	4	Sosialisasi Intensif melalui FGD dengan Stakeholder Kota/Kabupaten	23-Apr-09	15-May-09											0.85																																																					
D		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Pelatihan BKM/Relawan/UP (ditambah 3 hari utk Manajemen Keuangan)	18-Apr-09	2-May-09									0.55																																																						
E		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Pelatihan BKM/Relawan/UP (ditambah 3 hari utk Manajemen Keuangan)	18-Apr-09	2-May-09									0.55																																																						
F		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	Sosial Mapping dan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan/Desa	6-Apr-09	19-May-09											1.64																																																					
IV		BULAN MEI 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																			
	1	Pelatihan Utama-1 Fasilitator & Askot(Review Pelaksanaan siklus & CDM)	12-May-09	15-May-09										0.13																																																						
B		PEMDA KOTA/KAB LAMA																																																																			
	1	Lokakarya Review Program Kota/Kab Lama (1x)	13-May-09	26-Jun-09																1.68																																																
	2	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab lama	16-May-09	29-Jun-09																1.68																																																
C		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Pelatihan Utama Relawan/BKM/sekre/UP/Lurah (review pelaksanaan siklus & CDM)(3 hr)	22-May-09	29-May-09											0.28																																																						
D		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Pengajuan & adm pencairan BLM-2 (50%) Lokasi lanjutan 2008	13-May-09	17-Jun-09										1.39																																																						
	2	Pelatihan Utama Relawan/BKM/sekre/UP/Lurah (review pelaksanaan siklus & CDM)(3 hr)	22-May-09	29-May-09											0.28																																																						
E		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Penggalian Relawan	20-May-09	15-Jun-09														1.00																																																	
	2	Sosialisasi Massal	30-May-09	4-Jun-09													0.20																																																		
V		BULAN JUNI 2009																																																																			
A		PEMDA KOTA/KAB LAMA																																																																			
	1	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab	6-Jun-09	22-Jun-09															0.62																																																	
	2	Fasilitasi Review PJM Pronangkis kota/kab	16-Jun-09	2-Oct-09																													4.11																																				
B		PEMDA KOTA/KAB BARU																																																																			
	1	Pelatihan Dasar Aparat Pemda (3hr)	18-Jun-09	29-Jun-09																0.43																																																
C		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Penguatan kelembagaan dan perbaikan pengelolaan keuangan	15-Jun-09	22-Jun-09															0.28																																																
	2	Pengajuan & adm pencairan BLM-1 (30%)	15-Jun-09	18-Jul-09																			1.27																																													
D		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke BKM & pembentukan KSM Lokasi lanjutan 2008	10-Jun-09	2-Jul-09																	0.89																																															
	2	Penguatan kelembagaan dan perbaikan pengelolaan keuangan	15-Jun-09	22-Jun-09															0.28																																																
	3	Pelaksanaan pemanfaatan BLM-2 lokasi lanjutan 2008	29-Jun-09	3-Sep-09																									2.52																																								
E		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	FGD Refleksi Kemiskinan (RK)	2-Jun-09	27-Jun-09																0.96																																																
	2	Pelatihan Relawan + OJT 1 (RK, Rkelembg, Rkepemimp)	11-Jun-09	27-Jun-09																0.62																																																
	3	Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDG's di lokasi baru 2009	24-Jun-09	25-Aug-09																								2.37																																									
VI		BULAN JULI 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																			
	1	Pelatihan dasar -2 Faskel	4-Jul-09	18-Jul-09																			0.53																																													
B		PEMDA KOTA/KAB BARU																																																																			
	1	Pembentukan KBP	20-Jul-09	21-Aug-09																							1.23																																									
	2	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab baru	20-Jul-09	10-Dec-09																																										5.44																						
C		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke BKM & pembentukan KSM	8-Jul-09	31-Jul-09																				0.89																																												
	2	Pelaksanaan pemanfaatan BLM-1	27-Jul-09	11-Sep-09																										1.76																																					
D		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	Pendampingan Pembentukan KSM & Usulan Kegiatan KSM	21-Jul-09	15-Aug-09																						0.96																																									
	2	Pembentukan BKM	23-Jul-09	27-Aug-09																								1.34																																						
VII		BULAN AGUSTUS 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																			
	1	Pelatihan Utama 2 Fasilitator & Askot (Open menu) (6 hari)	20-Aug-09	3-Sep-09																									0.55																																								
B		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Pengajuan dan adm pencairan BLM-2 (50%) (APBN & DDUPB)	17-Aug-09	10-Sep-09																										0.92																																						
C		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Pengajuan & adm pencairan BLM-3 (20%)	3-Aug-09	26-Aug-09																					0.89																																										
	2	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke BKM & pembentukan KSM Lokasi lanjutan 2008	19-Aug-09	11-Sep-09																										0.89																																				
	3	Pelaksanaan pemanfaatan BLM-3 lokasi lanjutan 2008	29-Aug-09	9-Oct-09																																1.57																																
D		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	Perencanaan Partisipatif Penyusunan PJM Pronangkis Berbasiskan IPM - MDG's	21-Aug-09	13-Oct-09																																2.02																																
	2	Pelatihan Dasar BKM & UP-UP dan Sekretariat	26-Aug-09	11-Sep-09																										0.62																																				
	3	Pembentukan FKA-BKM	29-Aug-09	9-Oct-09																																1.57																																
VIII		BULAN SEPTEMBER 2009																																																																			
A		PERSIAPAN & PENGUATAN																																																																			
	1	Pelatihan Madya -2 Fasilitator dan Askot (3hari) (Forum BKM, Pemasaran Sosial, Proposal, BLM)	15-Sep-09	29-Sep-09																												0.55																																				
	2	Pelatihan dasar 3 Faskel	23-Sep-09	30-Sep-09																												0.28																																				
B		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke BKM & pembentukan KSM	3-Sep-09	25-Sep-09																									0.85																																						
	2	Proses penggalian data/ informasi melalui kajian ulang PS dan Renta PJM	23-Sep-09	19-Oct-09																																1.00																																
	3	Pelaksanaan pemanfaatan BLM-2	26-Sep-09	25-Nov-09																																				2.28																										
C		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Proses penggalian data/ informasi melalui kajian ulang PS dan Renta PJM	23-Sep-09	19-Oct-09																																1.00																																
D		LOKASI BARU PNPM 2009																																																																			
	1	Pengajuan & adm pencairan BLM-1 (30%)	18-Sep-09	8-Oct-09																																0.77																																
IX		BULAN OKTOBER 2009																																																																			
A		PEMDA KOTA/KAB BARU																																																																			
	1	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab baru	22-Oct-09	1-Dec-09																																																																
B		LOKASI LAMA PNPM 2009																																																																			
	1	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Review Keuangan kepada masyarakat	10-Oct-09	27-Oct-09																																0.66																																
	2	Pelaksanaan refleksi kelembagaan BKM di lingkungan internal BKM	13-Oct-09	16-Oct-09																																0.13																																
	3	Penyusunan draft revisi PJM & Pengesahannya	14-Oct-09	4-Nov-09																																0.81																																
	4	Pengajuan & adm pencairan BLM-3 (20%)	19-Oct-09	17-Nov-09																																1.11																																
	5	Pelaksanaan Review/Refleksi Kelembagaan BKM di Masyarakat oleh Tim RK-BKM	21-Oct-09	26-Oct-09																																0.20																																
	6	Identifikasi Permasalahan tentang Pemanfaatan BLM yang telah disalurkan ke KSM	24-Oct-09	27-Oct-09																																0.13																																
	7	Lokakarya Hasil Review/Refleksi Kelembagaan BKM tingkat Kelurahan/desa	27-Oct-09	2-Nov-09																																	0.24																																
	8	Penyusunan laporan review keuangan oleh Tim/panitia	31-Oct-09	3-Nov-09																																	0.13																																
C		LOKASI LANJUTAN 2008																																																																			
	1	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Review Keuangan kepada masyarakat	10-Oct-09	27-Oct-09																																0.66																																
	2	Pelaksanaan refleksi kelembagaan BKM di lingkungan internal BKM	13-Oct-09	16-Oct-09																																0.13																																
	3	Penyusunan draft revisi PJM & Pengesahannya	14-Oct-09	4-Nov-09																																	0.81																																
	4	Pengajuan & adm pencairan BLM-1 (30% TA 2009)	15-Oct-09	18-Nov-09																																		1.39																																
	5	Pelaksanaan Review/Refleksi Kelembagaan BKM di Masyarakat oleh Tim RK-BKM	21-Oct-09	26-Oct-09																																																															
	6	Identifikasi Permasalahan tentang Pemanfaatan BLM yang telah disalurkan ke KSM	24-Oct-09	27-Oct-09																																0.13																																
	7	Lokakarya Hasil Review/Refleksi Kelembagaan BKM tingkat Kelurahan/desa	27-Oct-09	2-Nov-09																																	0.24																																

| NO | | JENIS KEGIATAN | RENCANA MASTER SCHEDULE | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | | JULI | | | | AGUSTUS | | | | SEPTEMBER | | | | OKTOBER | | | | NOPEMBER | | | | DESEMBER | | | | TAHUN 2010 JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | |
|---|---|---
